

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**INGRESO DE DOCUMENTOS**



**Nº 2640707**

**FECHA 16/09/2016 Hora 10:58:15**

**REGION**

**CLIENTE CTM 1353**  
**CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.**

**TUPA RUC 20383316473**

**CONCEPTO**

**NRO DE DOCUMENTO**

CS-007-16032378

**DESCRIPCION DEL DOCUMENTO**

REMITE PROYECTO DE ADENDA  
PARA LA AMPLIACION DE PLAZO DE  
LOS HITOS 1 Y 4 DEL ANEXO Nº 7  
DEL CONTRATO DE CONCESION SCT

**OFICINA RECIBE DGE**

DIRECCION GENERAL DE  
ELECTRICIDAD-N

**TIPO DOCUMENTO**

INFORME

**Nº FOLIOS DECLARADOS POR EL ADM. 3**

**MONTO 0.00 SIN COSTO**

**OBSERVACION DEL DOCUMENTO**

**OBSERVACION AL DOCUMENTO**

-----  
16/09/2016 10:58:15 APUMA

Central: (51) (1) 4111100

<http://www.minem.gob.pe>

Lima, 16 de setiembre del 2016

CS - 007-16032378

Señora:  
**Carla Paola Sosa Vela**  
Directora General de Electricidad  
**Ministerio de Energía y Minas**  
Av. Las Artes N° 260, San Borja  
Presente.-

<b>MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS</b>	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL	
<b>RECIBIDO</b>	
<b>16/09/2016</b>	
N° Registro :	<b>2640707</b>
Caja : AFUMA	Hora : 10:58
La recepción del documento no es señal de conformidad	

**Asunto:** Proyecto de Adenda N° 1 al Contrato de Concesión SCT "Línea de Transmisión 220 kV La Planicie – Industriales y Subestaciones Asociadas"

**Referencia:** CS01275-16032266 (Registro N° 2635266), CS000292-15032266 (Registro N° 2496174) y CS00413-15032266 (Registro N° 2506734)

De mi mayor consideración:


Me dirijo a usted con la finalidad de remitirle el proyecto de Adenda para la ampliación de plazo de los hitos 1 y 4 del Anexo N° 7 del Contrato de Concesión SCT del Proyecto "Línea de Transmisión 220 kV La Planicie – Industriales y Subestaciones Asociadas".

Esta ampliación de plazo está amparada en lo establecido en la Cláusula 4 numeral 4.3 del Contrato SCT, debido a los retrasos en la aprobación de Estudio de Impacto Ambiental no atribuibles a CTM. Dichos retrasos han sido sustentados mediante informes enviados a su despacho con cartas de la referencia.

Por lo expuesto, solicitamos la suscripción de la Adenda N° 1 para la ampliación de los plazos señalados. Quedamos a la espera de sus comentarios o su conformidad para iniciar las gestiones de suscripción de la Adenda en mención.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.

Atentamente,

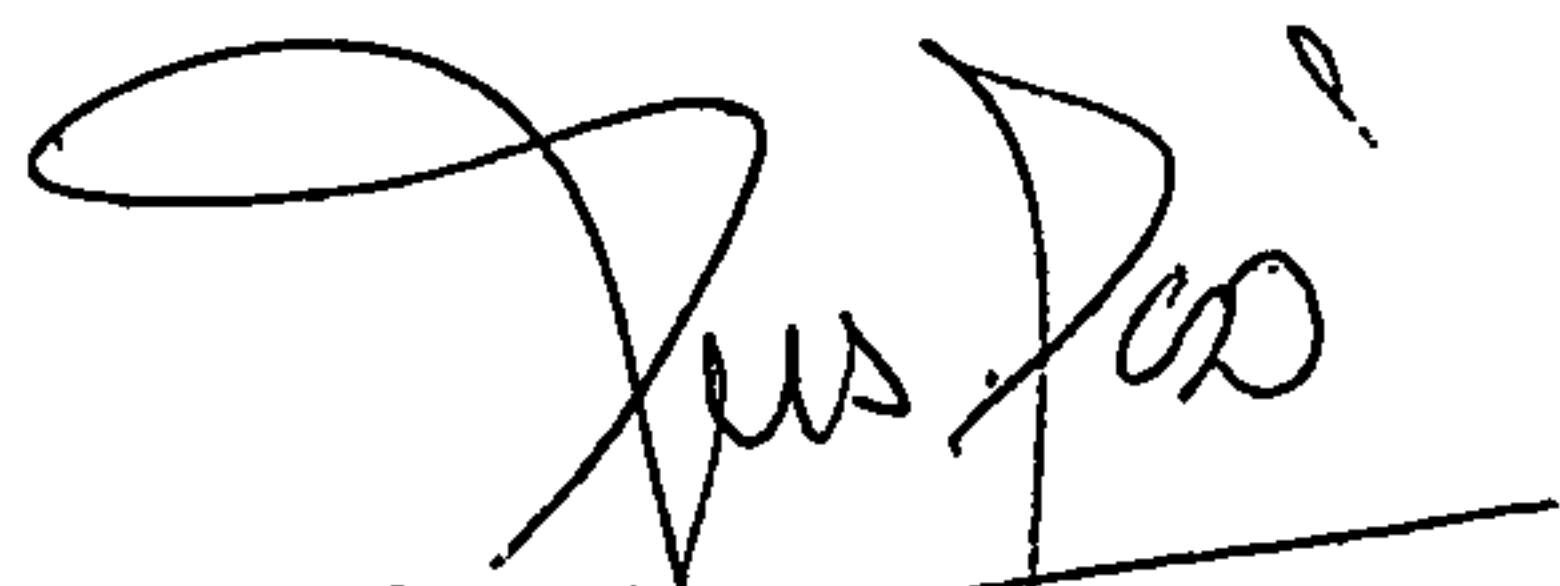

**Luis Miguel Lazo Velarde**  
**Representante Legal**



**PRIMERA ADENDA**  
**CONTRATO DE CONCESIÓN SCT**  
**“LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV LA PLANICIE – INDUSTRIALES Y SUBESTACIONES**  
**ASOCIADAS” QUE OTORGA DE UNA PARTE**  
**“MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS”**  
**Y DE LA OTRA PARTE**  
**“CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.”**

Conste por el presente documento, la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión SCT “Línea de Transmisión 220 kV La Planicie – Industriales y Subestaciones Asociadas” (en adelante, el Contrato SCT), que celebran, de una parte el Estado Peruano (en adelante, el Concedente), actuando a través del Ministerio de Energía y Minas, con domicilio en Av. De Las Artes N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Directora General de Electricidad, señora Carla Paola Sosa Vela, identificada con DNI N° \_\_\_\_\_, designada mediante Resolución Ministerial N° \_\_\_\_-2016-MEM/DM publicada el \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016 y facultada expresamente para suscribir el presente documento mediante la Resolución Ministerial N° \_\_\_\_\_ publicada el \_\_\_\_\_; y, de la otra parte la empresa CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (en adelante, la Sociedad Concesionaria) con RUC N° 20383316473, inscrita en la Partida N° 11014647 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, con domicilio en Av. Juan de Arona N° 720, oficina 601, San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General, señor Carlos Mario Caro Sánchez, identificado con Carné de Extranjería N° 000823913, facultado para el efecto según poder que obra inscrito en la partida registral antes aludida; en los términos y condiciones siguientes:

**PRIMERA:**

El 11 de setiembre del 2014, el Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MEM) y Consorcio Transmantaro S.A. (en adelante, CTM) suscribieron el Contrato de Concesión SCT, en cuyo Anexo 7 se estipulan los plazos para el desarrollo del proyecto, de la siguiente manera: 1) Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad Gubernamental competente para el 11 de setiembre del 2015, 2) Cierre Financiero del Proyecto para el 11 de noviembre del 2015, 3) Llegada a los correspondientes sitios de obra de los cables subterráneos y accesorios para el 11 de mayo del 2016, y 4) Puesta en Operación Comercial (POC) para el 11 de setiembre del 2016.

**SEGUNDA:**

Bajo Registros N° 2496174 de fecha 8 de mayo de 2015 y N° 2506734 de fecha 15 de junio de 2015, se solicitó ampliación de plazo por sesenta y nueve (69) días calendario por retraso en la calificación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) y catorce (14) días calendario por retraso en la emisión del pronunciamiento al Plan de Participación Ciudadana, respectivamente. Adicionalmente, con Registro N° 2635266 de fecha 31 de agosto de 2016, se solicitó ampliación de plazo por ciento ochenta y dos (182) días calendario debido a la demora en la entrega de observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y sesenta (60) días calendario por retraso en la emisión del pronunciamiento de aprobación del EIA. La ampliación total de plazo solicitada por CTM para el cumplimiento de los hitos 1) y 4) del Contrato SCT, debido a la demora en la aprobación del EIA, es de 325 días calendario.

El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 224-2016-MEM/DGAAE con fecha de notificación 1 de agosto de 2016.



**TERCERA:**

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 1314 del Código Civil, quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

En aplicación de la cláusula 4, numeral 4.3, del Contrato SCT, teniendo en cuenta que los retrasos en la aprobación de Estudio de Impacto Ambiental no son atribuibles a CTM y que ésta ha mostrado una conducta diligente; así como en atención a los informes \_\_\_\_\_ emitidos por \_\_\_\_\_, se considera procedente prorrogar por 325 días calendario los hitos 1) y 4) del Anexo N° 7 del Contrato SCT.

**CUARTA:**

En virtud de la presente Minuta, las Partes acuerdan Modificar el Anexo N° 7 del Contrato SCT – “Plazos para el desarrollo del Proyecto”, el mismo que quedará definido conforme al cronograma adjunto a la presente Adenda.

**QUINTA:**

Mediante Resolución Ministerial N° \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, se aprobó el texto de la Adenda N° 1 al Contrato SCT, que modificó el Anexo N° 7, según lo indicado en la cláusula anterior.

Todas las demás estipulaciones del Contrato de Concesión no contempladas de manera específica en la presente Minuta, mantienen plena vigencia en tanto no se opongan a lo aquí acordado.

**SEXTA:**

Los gastos notariales y registrales que demande la elevación de esta Minuta a Escritura Pública y su inscripción en los Registros Públicos, así como un Testimonio de la Escritura debidamente inscrita para el Concedente, serán de cargo y cuenta del Concesionario.

Agregue usted, señor Notario la introducción y la conclusión de Ley, y efectúe los insertos correspondientes, especialmente el texto de la Resolución Ministerial \_\_\_\_\_, así como la modificación del Anexo N° 7 del Contrato SCT “Línea de Transmisión 220 kV La Planicie – Industriales y Subestaciones Asociadas”; y cuide de cursar los respectivos partes al Registro de Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos del Registro de Propiedad Inmueble para su debida inscripción.

En señal de aprobación y conformidad, el presente documento es suscrito en tres (03) ejemplares de un mismo tenor, en Lima, a los \_\_\_\_\_.

**CONCEDENTE**

Ministerio de Energía y Minas  
Sr. \_\_\_\_\_  
DNI N° \_\_\_\_\_

**CONCESIONARIA**

Consortio Transmantaro S.A.  
Sr. Carlos Mario Caro Sánchez  
C.E. N° 000823913

## ANEXO N° 7

### **Plazos para el desarrollo del Proyecto**

Los siguientes hitos deberán cumplirse en los plazos que se indican a continuación (todos contados a partir de la fecha de Cierre):

<b>Hitos</b>	<b>Plazo</b>
1.- Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad Gubernamental competente.	01/08/2016
2.- Cierre Financiero del Proyecto.	11/11/2015
3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los cables subterráneos y accesorios	11/05/2016
4.- POC	02/08/2017

La fecha de Puesta en Operación Comercial será la consignada en el acta a que se refiere la Cláusula 5.4.
